

令和2年度(2020年度)公共事業再評価調査

基準年月日 令和2年8月1日

Table with multiple sections: I. Basic Information (Project No. 08-24, Dept. Construction, Budget 4,558 million), II. Public Project Evaluation Process (Timeline from H28 to R6), III. Project Selection Status (Background, Review Process, Effectiveness), IV. Project Implementation Status (Progress, Effectiveness, Cost Reduction). Includes detailed financial and operational data.

V 評価							
1. 必要性	令和2年3月に留萌ICまで高規格道路が整備され、留萌ICへのアクセスの向上、また、H28年度「留萌市通学路交通安全プログラム」で対策箇所位置付けられている。このことから、高速ネットワークを利用した地域間の連携強化、地域の安全性の向上の観点から重要性に変わりはない、当該事業の必要性に変化はない。						
	a	a：事業の必要性に変化はなく予定どおり事業を推進する。 b：着工後の状況変化により事業計画の変更が必要である。 c：着工後の状況変化により事業推進の是非を判断する必要がある。					
2. 事業を推進する上での課題	(1) 環境上の配慮及び課題						
	<ul style="list-style-type: none"> ●事前の環境調査で確認された希少種について移植を実施している。 ●工事実施にあたっては、排出ガス対策の機械または低音・低振動対策型機械の使用や、工事による家屋への影響調査を実施する。 						
	(2) 事業推進に対する住民の動向						
3. 事業達成の見込み	毎年、留萌市や留萌地域総合開発期成会から整備促進の要望を受けている。						
	(3) その他の課題						
	特になし						
4. 対処方針	用地補償や軟弱地盤対策に時間を要し工期を延伸しているが、既に本工事に着手しており、今後は概ね計画どおり進捗する予定である。						
	a	a：現時点では事業の進捗に影響する課題はなく、達成が見込まれる。 b：課題はあるものの達成は可能である。 c：大きな課題があり達成には相当の困難が予想される。					
4. 対処方針	事業の必要性に変化はなく、自治体からの早期完成要望が強く、事業達成が十分に見込まれることから、事業継続する。						
	a	a：継続 b：終了 c：休止 d：中止					
	事業期間の変更の有無	有	事業費の変更の有無	有	事業内容変更の有無	目的・規模等に係る変更 有	左記以外の変更 無
VI 備考							
1. 評価履歴	事前評価：平成26年度実施 評価結果：要望を行うことは妥当 B/C：1.40						
2. その他の取組事項							


補足資料

VII 事業計画変更							(単位：百万円)			
再評価	事業採択	着手	変更年度	完了予定	経過年数	総事業費(a)	道負担額	当該年度事業費	累積事業費(b)	進捗率(b)/(a)
事前評価又は当初	H28 (2016)	H29 (2017)		H34 (2022)	経過年数 4	2,785	1,114			
変更①		H29 (2017)	H29 (2017)	H34 (2022)		3,485	1,394			
変更② 1回目		H29 (2017)	R2 (2020)	R6 (2024)		4,558	1,823	654	1,595	35%
変更③										
変更④										
変更⑤										
変更⑥										
変更⑦										
変更⑧										
変更⑨										
変更⑩										
変更理由・内容	<p>変更①：事業費の変更 現地実測調査の結果、当初想定していた地盤線と異なり、土工量が大幅に増えた。また、地質調査の結果、切土法面の安定勾配が変更となった。</p> <p>変更②：事業費の変更 地質調査結果より、当初想定していた支持層が深く、当初想定していた擁壁の工法が変更となった。 地すべり解析の結果、当初想定していた対策位置が変更となり、対策範囲が広がった。 過年度から行っていた、補償家屋の詳細調査の結果、当初想定から移転工法の変更等が生じ、令和2年度に用地補償費が確定した。 資材及び労務単価の上昇や消費税率の変更。 事業期間の延伸 軟弱地盤対策や用地取得に時間を要し延伸する。</p>									

事業概要図

事業名	都市計画街路事業費 (社会資本整備総合交付金)	地区名	3・4・18見晴通(留萌市)
-----	----------------------------	-----	----------------

事業地区位置図

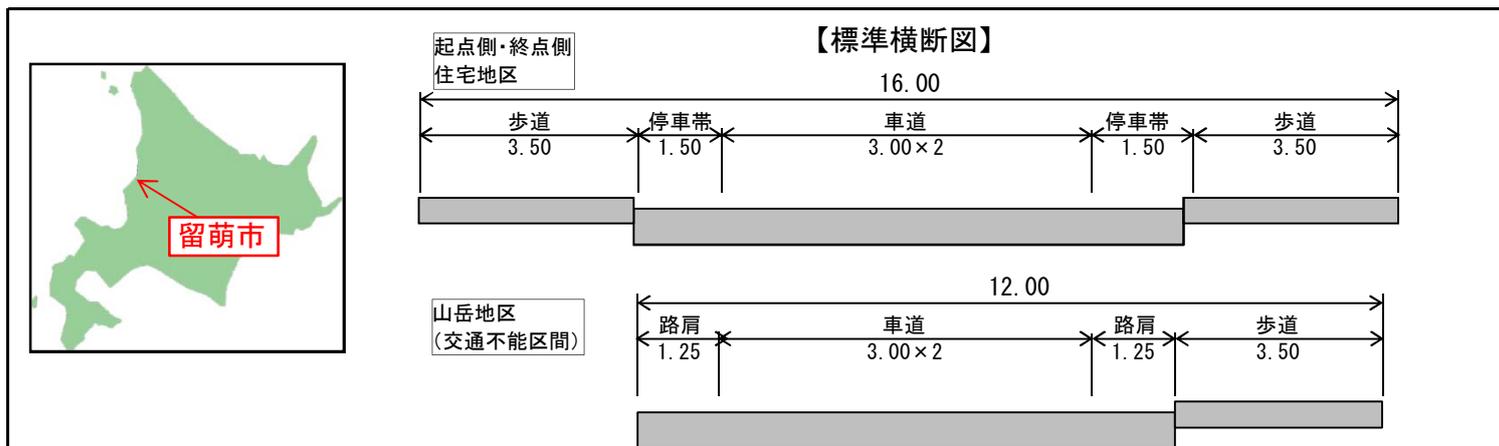

【整備前の状況】



【位置図】

